



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
Satun Provincial Health Office

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

✽ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
Satun Provincial Health Office

งบดำเนินงาน



รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย (ไม่รวม ผูกพัน)	ร้อยละการ เบิกจ่าย (รวมผูกพัน)
งบสำนักปลัด	56,623,994.37	-	56,623,994.37	-	100.00%	100.00%
งบเบิกแทนฯ	740,381.00	-	740,381.00	-	100.00%	100.00%
รวม	57,364,375.37	-	57,364,375.37	-	100.00%	100.00%

งบอุดหนุน



รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย (ไม่รวม ผูกพัน)	ร้อยละการ เบิกจ่าย (รวม ผูกพัน)
โครงการควบคุมหนอน พยาธิ	20,000.00	-	20,000.00	-	100.00%	100.00%
รวม	20,000.00	-	20,000.00	-	100.00%	100.00%



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
Satun Provincial Health Office

รายงานติดตาม ความก้าวหน้า งบประมาณ



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
Satun Provincial Health Office

งบลงทุนเงินกัน ปี พ.ศ. 2567




ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	งวด งาน ทั้งสิ้น	งวดงาน ตาม แผน	งวดงาน ปัจจุบัน	รายละเอียดความ ก้าวหน้า
1	บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.ต้นหยงกลิง	1,262,566.00	1,262,566.00	-	100%	5	5	5	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
2	บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านผึ่ง 34	1,138,200.00	1,138,200.00	-	100%	5	5	5	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
3	อาคารพัสดุ โรงพยาบาลท่าแพ	8,328,070.40	8,328,070.40	-	100%	5	5	5	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
4	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย รพ.ควนโดน	9,925,000.00	9,925,000.00	-	100%	8	8	8	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
รวม		20,653,836.40	20,653,836.40	-	100%				



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
Satun Provincial Health Office

งบลงทุน ปี พ.ศ.2568



งบประมาณ	รายการ	สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ NGF	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ (PO แล้ว)	ร้อยละ เบิกจ่าย	งวดงาน ทั้งสิ้น	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	ความก้าวหน้า
งบผูกพัน 2566-2570	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ละงู	3 ก.พ. 2569	32,967,400.00	32,967,400.00	-	100%	16	14	10	- เบิกจ่ายแล้ว 9 งวด (งวด 9 ยังค้างเบิกอีก 302,074.78 บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณปี 2569) - อยู่ในระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 10
งบผูกพัน 2568-2570	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ รพ.ละงู ปี 68 = 2,677,700 ปี 69 = 5,156,900 ปี 70 = 5,553,600 รวม 13,388,200	20 ส.ค. 2569	2,677,700.00	-	2,677,700.00	0%	7	1	1	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 (ผลงานประมาณ 20%)
งบ 2568	อาคารเรือนนอน รพ.ท่าแพ	28 ส.ค. 2568	1,535,000.00	1,535,000.00	-	100%	3	3	3	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
งบ 2568	อาคารกายภาพบำบัด รพ.ควนโดน	20 เม.ย. 2569	11,585,300.00	-	11,585,300.00	0%	6	2	1	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 (ผลงานประมาณ 50%)
งบ 2568	อาคารตรวจและเก็บศพ รพ.ละงู	25 พ.ย. 2568	6,920,000.00	-	6,920,000.00	0%	5	3	1	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 (ผลงานประมาณ 70%) สาเหตุที่ล่าช้า : เนื่องจากผลทดสอบชั้นดินล่าช้า
งบ 2568	ปรับปรุงทัศนียภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล	16 ก.ย. 2568	490,000.00	490,000.00	-	100%	1	1	1	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
รวม			56,175,400.00	34,992,400.00	21,183,000.00	62.00%				

งบลงทุน ปี พ.ศ.2568 (ครุภัณฑ์)



ที่	รายการ	งบประมาณ NGF	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ (PO แล้ว)	ร้อยละ เบิกจ่าย	งวดงาน ทั้งสิ้น	
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.สตูล 9 รายการ (38 หน่วย)	896,600.00	896,600.00	-	100%	1	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
2	ครุภัณฑ์ sw.คอนโดน						
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ (7 หน่วย)	445,900.00	445,900.00	-	100%	1	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
	- ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ (1 หน่วย)	146,890.00	146,890.00	-	100%	1	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (4 หน่วย)	154,000.00	154,000.00	-	100%	1	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ (2 หน่วย)	47,800.00	47,800.00	-	100%	1	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
3	ครุภัณฑ์ sw.คอนกาสอง						
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ (214 หน่วย)	1,002,000.00	1,002,000.00	-	100%	1	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ (1 หน่วย)	8,000.00	8,000.00	-	100%	1	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ sw.ท่าแพ 6 รายการ (172 หน่วย)	998,000.00	998,000.00	-	100%	1	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ sw.ทุ่งหว้า 7 รายการ (172 หน่วย)	999,900.00	999,900.00	-	100%	1	เบิกจ่ายครบ 100% ✓

งบลงทุน ปี พ.ศ.2568 (ครุภัณฑ์) (ต่อ)




ที่	รายการ	สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ NGF	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ (PO แล้ว)	ร้อยละเบิกจ่าย	งวดงานทั้งสิ้น	
6	ครุภัณฑ์ SW.มะนัง							
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ (59 หน่วย)		956,500.00	956,500.00	-	100%	1	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
	- ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ (1 หน่วย)		370,000.00	370,000.00	-	100%	1	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
7	ครุภัณฑ์ SW.ละงู							เบิกจ่ายครบ 100% ✓
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ (208 หน่วย)		1,253,175.00	1,253,175.00	-	100%	1	เบิกจ่ายครบ 100% ✓
	- ครุภัณฑ์การแพทย์ 36 รายการ (85 หน่วย)		19,395,300.00	17,396,300.00	1,999,000.00	89.69%	1	อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย 2 หน่วย
	- ครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมอาคาร (เครื่อง Multiplace Hyperbaric Chamber)	25ม.ค.69	47,190,079.07	-	47,190,079.07	0%	1	กันเงินเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น			73,864,144.07	24,675,065.00	49,189,079.07	33.41%		

งบกลางปี พ.ศ.2568 (ครุภัณฑ์)



ที่	รายการ	งบประมาณ NGF	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	งวด งาน ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การแพทย์ SW.ละกู จำนวน 1 เครื่อง	1,600,000	-	1,600,000	100%	1	- อยู่ในขั้นตอน ประกาศเชิญชวนฯ (ยื่นวันที่3ต.ค.68) - ได้ดำเนินการกัน เงินในระบบ เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	รายการ		ก่อนประกาศ				ประกาศ	รอลงนาม	ลงนามแล้ว	หมายเหตุ
		สิ่งก่อสร้าง	จัดทำ แผน จัดซื้อจัด จ้าง	แต่งตั้ง บุคคล/ คกก. TOR,SPEC, ราคากลาง	จัดทำ TOR,SPEC, ราคากลาง	จัดทำร่าง เอกสาร/หนังสือ ชวน/รายงานขอ ซื้อขอจ้าง/ร่าง เอกสารประกวด ราคา	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศผู้ชนะ		
โรงพยาบาลควนโดน 3 รายการ	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบแพทย์ทางไกลแบบพกพาพร้อมชุดรับสัญญาณภาพดิจิตอลแบบไร้สาย โรงพยาบาลควนโดน ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	ครุภัณฑ์ การแพทย์ฯ		✓						- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปกและราคากลาง (แฟ้มเสนออยู่ศาลากลาง) - คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศภายในวันที่ 2 ต.ค.68
	เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร โรงพยาบาลควนโดน ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	ครุภัณฑ์ การแพทย์ฯ		✓						- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปกและราคากลาง (แฟ้มเสนออยู่ศาลากลาง) - คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศภายในวันที่ 2 ต.ค.69
	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลควนโดน ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	ครุภัณฑ์ การแพทย์ฯ		✓						- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปกและราคากลาง (แฟ้มเสนออยู่ศาลากลาง) - คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศภายในวันที่ 2 ต.ค.70
โรงพยาบาลควนกาหลง 1 รายการ	ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยใน (IPD paperless) โรงพยาบาลควนกาหลง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 1 ชุด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ				✓				- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ - คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ ภายในวันที่ 30 ก.ย.68
โรงพยาบาลท่าแพ 1 รายการ	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง โรงพยาบาลท่าแพ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	ครุภัณฑ์ การแพทย์ฯ				✓				- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ - คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ ภายในวันที่ 30 ก.ย.68
โรงพยาบาลมะนัง 2 รายการ	ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยใน (IPD paperless) โรงพยาบาลมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 ชุด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ				✓				- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ - คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ ภายในวันที่ 30 ก.ย.68
	ยุניתทำฟัน โรงพยาบาลมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 ชุด	ครุภัณฑ์ การแพทย์ฯ					✓			อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดซื้อและประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะภายในวันที่ 25 ก.ย.68
สสจ.สตูล 1 รายการ	บ้านพักข้าราชการชำนานุกรณ/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 หลัง	สิ่งก่อสร้าง					✓			- จัดทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ 17/9/68 - กำหนดยื่นข้อเสนอและเปิดซองฯ 2/10/68
รวมทั้งสิ้น		8	0	3	0	3	2	0	0	

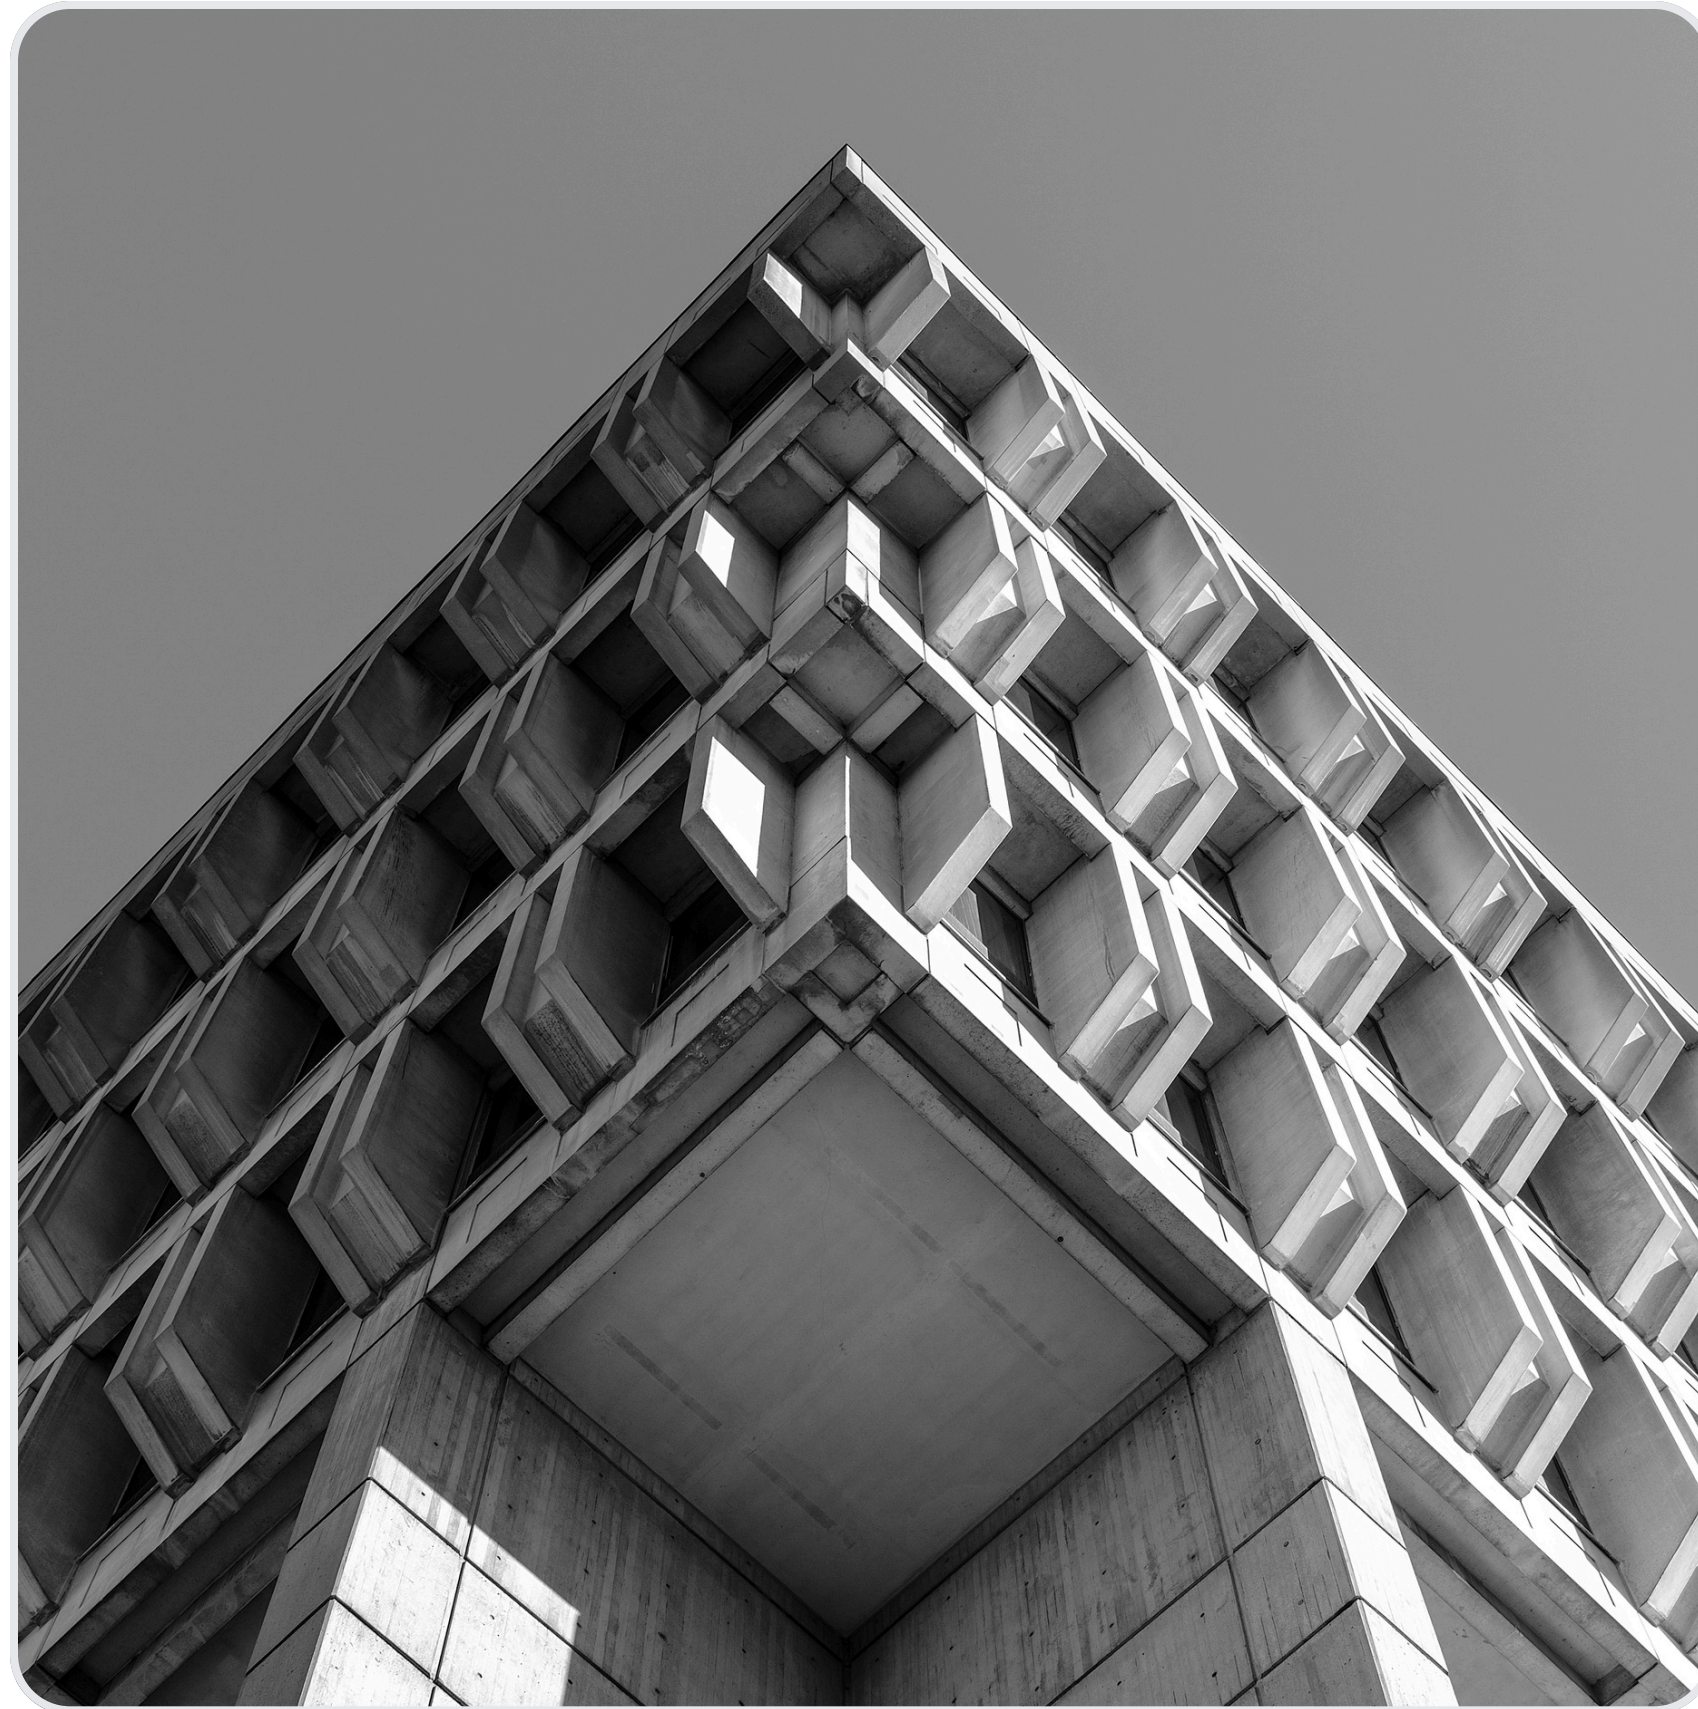

THANK YOU!

🌐 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
