




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
Satun Provincial Health Office


รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
Satun Provincial Health Office

งบดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2569



รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย (ไม่รวมผูกพัน)	ร้อยละการ เบิกจ่าย (รวมผูกพัน)
1. งบดำเนินงาน สป.	20,806,620.00	-	13,418,249.68	7,388,370.32	64.49%	64.49%
2. งบเบิกแทน	507,669.00	-	230,024.84	277,644.16	45.31%	45.31%
รวมงบดำเนินงาน	21,314,289.00	-	13,648,274.52	7,666,014.48	64.03%	64.03%

หมายเหตุ : 1. งบดำเนินงาน (ประกันสังคม, เงินกองทุน ปกส., คตส. ,พตส. ,ฉ.11, งบพื้นฐาน,งบเฉพาะของฝ่าย)


2. งบเบิกแทน (รับโอนจากกรมต่างๆ เช่น เบิกแทน อย., เบิกแทน อสม.)

มาตรการเบิกจ่ายของคลังจังหวัด ไตรมาส ที่ 2 งบรายจ่ายประจำ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60**



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
Satun Provincial Health Office

งบอุดหนุน ปี พ.ศ. 2569



รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย (ไม่รวมผูกพัน)	ร้อยละการ เบิกจ่าย (รวมผูกพัน)
งบอุดหนุน	70,000.00	-	70,000.00	-	100.00 %	100.00 %
รวมงบอุดหนุน	70,000.00	-	70,000.00	-	100.00%	100.00%



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
Satun Provincial Health Office

รายงานติดตาม ความก้าวหน้า งบประมาณ



ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
Satun Provincial Health Office

งบลงทุนเงินกัน ปี พ.ศ. 2568 (งบปีเดียว)



สิ่งก่อสร้าง

รายการ	สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ (PO แล้ว)	ร้อยละเบิกจ่าย	งวดงานทั้งสิ้น	งวดงานตามแผน	งวดงานปัจจุบัน	รายละเอียดความก้าวหน้า
อาคารกายภาพบำบัด รพ.ควนโดน ก่อนนี้ผูกพัน = 11,585,300.00 คืนเงินส่วนกลาง = 140,153.55 คงเหลือมูลค่าตามสัญญา = 11,445,146.45	20 เม.ย.69 ขยายเป็น 10 พ.ค. 2569	11,445,146.45	3,103,730.45	8,341,416.00	27.12%	6	4	3	- เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด - งวดที่ 3 ก่อสร้างประมาณ 80% คาดว่าส่งมอบได้ 20 กพ.69
อาคารตรวจและเก็บศพ รพ.ละงู	25 พ.ย.68	6,920,000.00	6,920,000.00	-	100.00%	5	5	5	- เบิกจ่ายครบ 100%
รวมทั้งสิ้น		18,365,146.45	10,023,730.45	8,341,416.00	54.58%				

มาตรการเบิกจ่ายของคลังจังหวัด ไตรมาส ที่ 2 งบลงทุน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 38**



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Satun Provincial Health Office

งบลงทุนเงินกัน ปี พ.ศ. 2568 (งบปีเดียว)



ครุภัณฑ์


รายการ	สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ (PO แล้ว)	ร้อยละเบิกจ่าย	งวดงานทั้งสิ้น	งวดงานตามแผน	งวดงานปัจจุบัน	รายละเอียดความก้าวหน้า
ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ละงู	31 ก.ค.68	1,999,000.00	1,999,000.00	-	100%	1	1	1	เบิกจ่ายแล้ว 100% ✓
ครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมอาคาร รพ.ละงู (เครื่อง Multiplace Hyperbaric Chamber)	25 ม.ค.69	47,190,079.07	-	47,190,079.07	0.00%	1	1	1	- อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร ประมาณ 50% - ครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างประกอบ ตัวเครื่อง 30%
รวมทั้งสิ้น		49,189,079.07	1,999,000.00	47,190,079.07	4.06%				

มาตรการเบิกจ่ายของคลังจังหวัด ไตรมาส ที่ 2 งบลงทุน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 38**



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
Satun Provincial Health Office

งบลงทุน ปี พ.ศ. 2568



ครุภัณฑ์ (งบกลาง)


รายการ	สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ (PO แล้ว)	ร้อยละ เบิกจ่าย	งวดงาน ทั้งสิ้น	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	รายละเอียดความก้าวหน้า
ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ละงู 1 รายการ - เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ	9 มี.ค.2569	1,600,000.00	-	1,600,000.00	0%	1	-	-	- รอส่งมอบ สัญญาสิ้นสุด 9 มี.ค. 69
รวมทั้งสิ้น		1,600,000.00	-	1,600,000.00	0%				

มาตรการเบิกจ่ายของคลังจังหวัด ไตรมาส ที่ 2 งบลงทุน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 38**



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Satun Provincial Health Office

งบลงทุน ปี พ.ศ. 2569 (งบผูกพัน)



สิ่งก่อสร้าง

รายการ	สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ (PO แล้ว)	ร้อยละเบิกจ่าย	งวดงานทั้งสิ้น	งวดงานตามแผน	งวดงานปัจจุบัน	รายละเอียดความก้าวหน้า
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ละงู ผูกพัน 2566-2570	3 กพ. 2569	62,249,400.00	30,166,175.34	32,083,224.66	48.46%	16	16	14-16	- เบิกจ่ายงวดที่ 13 - งวดที่ 14 ก่อสร้าง 95% - งวดที่ 15 ก่อสร้าง 77% - งวดที่ 16 ก่อสร้าง 45%
อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ รพ.ละงู	20 ส.ค.2569	2,677,700.00 5,156,900.00	- -	2,677,700.00 5,156,900.00	0% 0%	7	1	1	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 ก่อสร้าง 10% (รอคณะกรรมการแก้ไขสัญญาปรับฐานราค)
รวมทั้งสิ้น		70,084,000.00	30,166,175.34	39,917,824.66	43.04%				

มาตรการเบิกจ่ายของคลังจังหวัด ไตรมาส ที่ 2 งบลงทุน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 38**



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
Satun Provincial Health Office

งบลงทุน ปี พ.ศ. 2569 (งบปีเดียว)



สิ่งก่อสร้าง

รายการ	งบประมาณ	ก่อนประกาศ	ประกาศ เชิญชวน	รอลงนาม (ประกาศผู้ชนะ)	ลงนามแล้ว	รายละเอียดความก้าวหน้า
บ้านพักข้าราชการชำนานงาน/ ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ สสอ.มะนัง	1,309,200.00				/	<ul style="list-style-type: none"> - ลงนามเรียบร้อยแล้ว - บันทึก PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว

มาตรการเบิกจ่ายของคลังจังหวัด ไตรมาส ที่ 2 งบลงทุน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 38**




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Satun Provincial Health Office

งบลงทุน ปี พ.ศ. 2569 (งบปีเดียว) **ครุภัณฑ์**



รายการ	งบประมาณ	รอลงนาม	ลงนามแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	รายละเอียดความก้าวหน้า
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ รพ.ควนโดน	2,500,000.00		✓		-ลงนามสัญญา 30 ม.ค. 69 รอส่งมอบ
เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิก รพ.ควนโดน	290,000.00		✓		-ลงนามสัญญา 30 ม.ค. 69 รอส่งมอบ
เครื่องตรวจอวัยวะภายใน รพ.ควนโดน	450,000.00		✓		-ลงนามสัญญา 30 ม.ค. 69 รอส่งมอบ
ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยใน (IPD paperless) รพ.มะนัง	985,900.00	✓			- ประกาศผู้ชนะ 24 ต.ค.68 มีการอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - รอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตอบกลับ (คณะกรรมการฯรับเรื่อง วันที่ 23 พ.ย. 68 ครบวันพิจารณาแล้วรอผลเป็นลายลักษณ์อักษร)
ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยใน (IPD paperless) รพ.ควนกาหลง	985,900.00			985,000.00	- เบิกจ่ายแล้ว 100% (เงินเหลือจ่าย 900 บาท รอส่งคืนกองคลัง)
เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ รพ.ท่าแพ	850,000.00			849,000.00	- เบิกจ่ายแล้ว 100% (เงินเหลือจ่าย 1,000 บาท รอส่งคืนกองคลัง)
ยูนิตทำฟัน รพ.มะนัง	460,000.00			459,000.00	- เบิกจ่ายแล้ว 100% (เงินเหลือจ่าย 1,000 บาท รอส่งคืนกองคลัง)
รวมทั้งสิ้น	6,521,800.00			2,293,000.00	35.16%

มาตรการเบิกจ่ายของคลังจังหวัด ไตรมาส ที่ 2 งบลงทุน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 38**

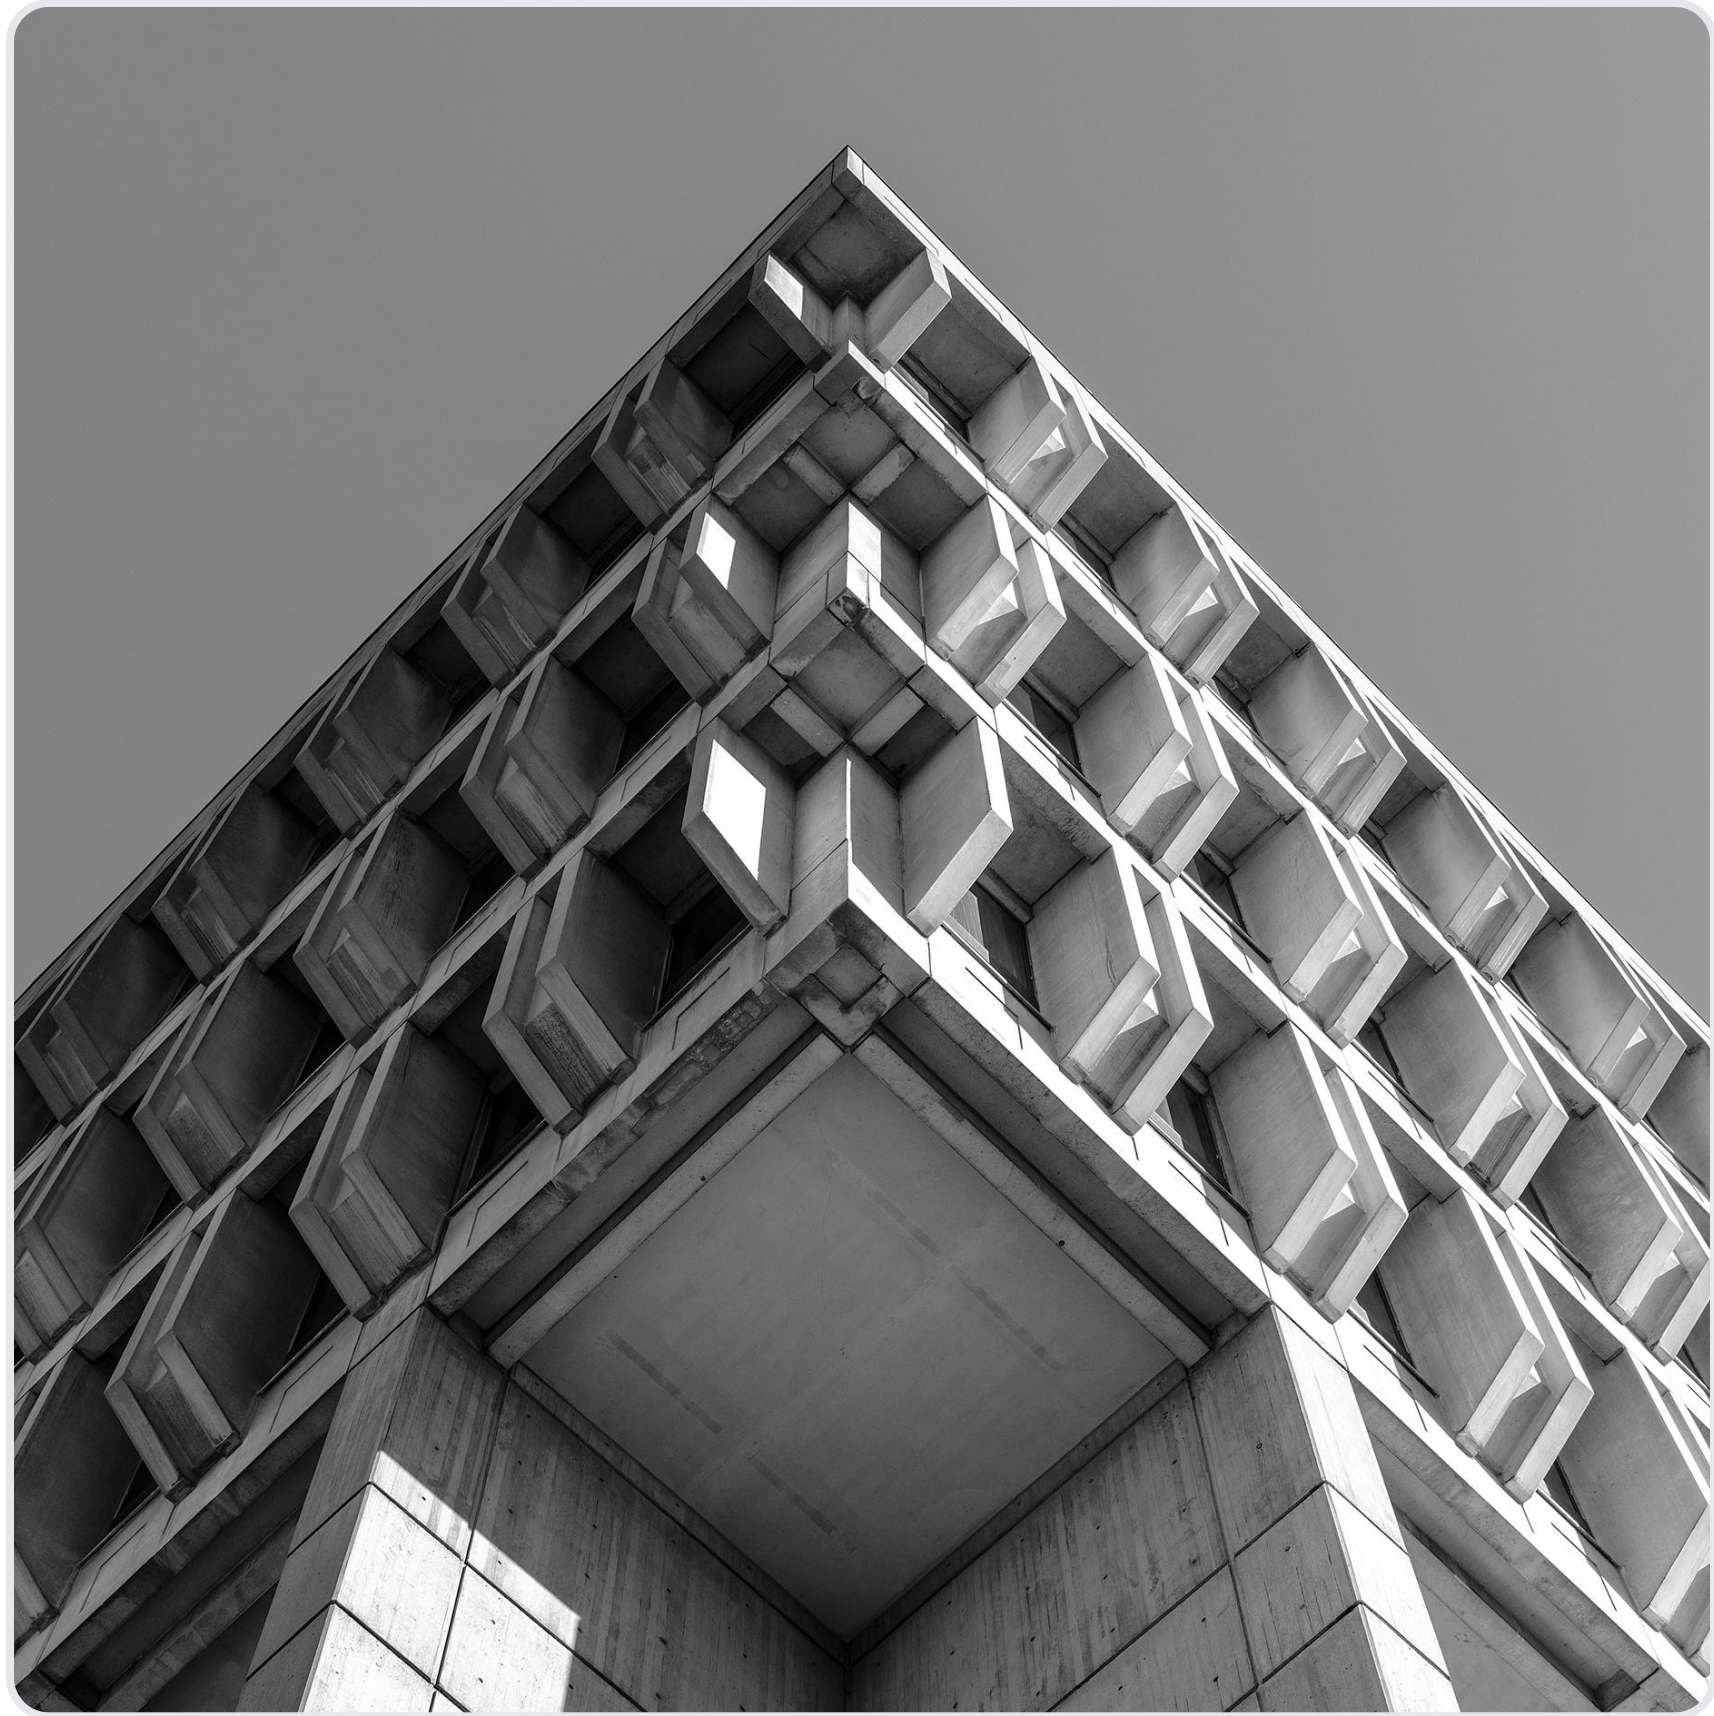

THANK YOU!

🌐 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
